


# «Современный детский сад – территория здоровья. Ремонт санузлов групп»



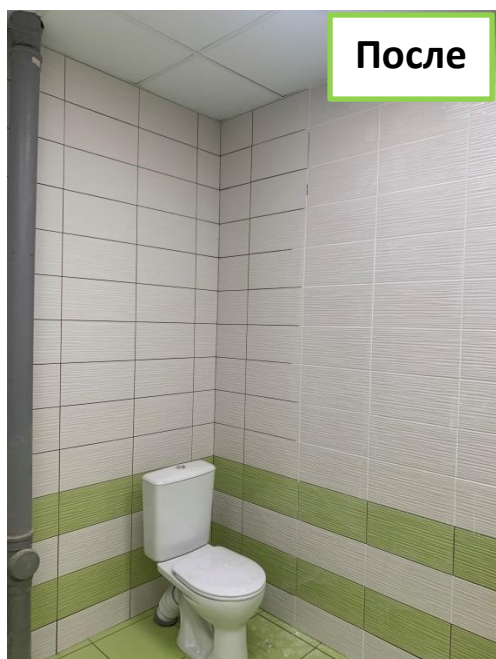

Приложение 1  
к распоряжению Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.10.2023 № 13

«УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.10.2023 № 13)

Форма

### ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования  
Наименование муниципального образования Дмитровский городской округ

Наименование проекта «Современный детский сад – территория здоровья. Ремонт санузлов групп»

#### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного |                             |                           |                  | Фактическое поступление средств на реализацию проекта |                             |                           |                  | Использовано средств на реализацию проекта инициативного |                             |                           |                  | Примечание |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Всего   | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего   | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего  | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* |            |
| 1=2+3+4   | 2                           | 3                         | 4                | 5 = 6 + 7 + 8   | 6                           | 7                         | 8                | 9 = 10 + 11 + 12   | 10                          | 11                        | 12               |            |
| 1 100 000,00  | 1 045 000,00                | 44 000,00                 | 11 000,00        | 1 100 000,00  | 1 045 000,00                | 44 000,00                 | 11 000,00        | 1 100 000,00   | 1 045 000,00                | 44 000,00                 | 11 000,00        |            |

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

#### 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:


3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 11.11.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 14.12.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Волнушкин А.Н.  
(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава Дмитровского городского округа:

Поночевный И.И.  
(Ф.И.О.)



(подпись)

М.П.

Дата «19» января 2023 г.



