

Муниципальное общеобразовательное учреждение Яхромская средняя общеобразовательная школа №1 (1 и 2 корпус). Ремонт помещений, приобретение, демонтаж и установка пластиковых оконных блоков



До



До



До



До






После



После

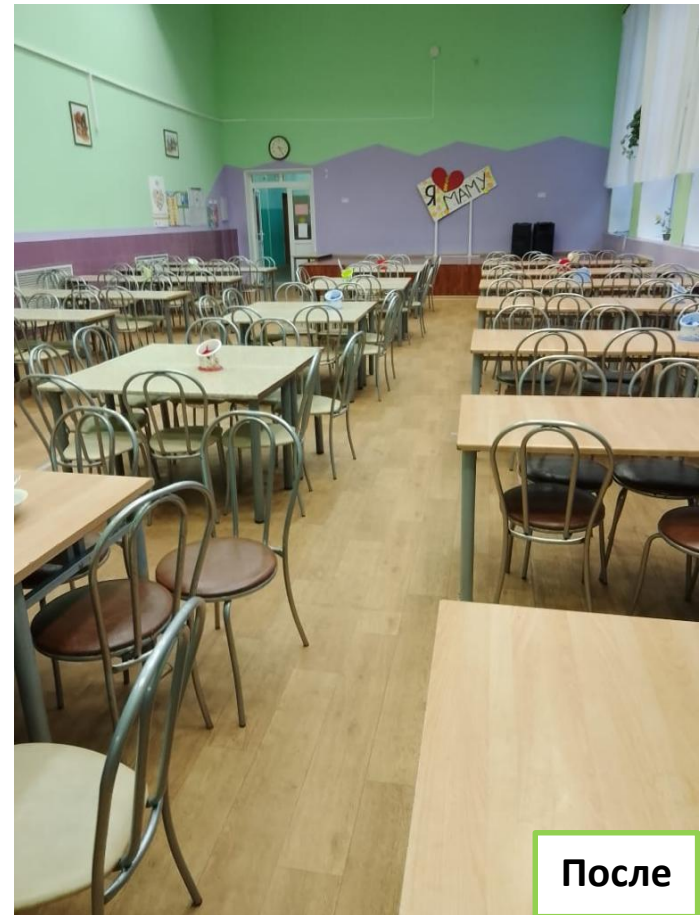

После

Приложение 1
к распоряжению Главного управления
территориальной политики
Московской области
от _____ № _____

«УТВЕРЖДЕНА»
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Главного управления
территориальной политики
Московской области
от _____ № _____)

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
Наименование муниципального образования Дмитровский городской округ

Наименование проекта проект инициативного бюджетирования Муниципальное общеобразовательное учреждение Яхромская средняя общеобразовательная школа №1 (1 и 2 корпус).
Ремонт помещений, приобретение, демонтаж и установка пластиковых оконных блоков.

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
2 066 120,00	1 500 000,00	442 150,00	123 970,00	2 066 120,00	1 500 000,00	442 150,00	123 970,00	1 850 000,00	1 343 097,21	395 902,79	111 000,00	216 120,00		

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 17.11.2022 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 23.12.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Шерченко М.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

И.о. Главы Администрации Дмитровского городского округа:

Сидоров А.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата «23» декабря 2022 г.

