

Текущий ремонт внутренних помещений и кровли



до




после



до



после

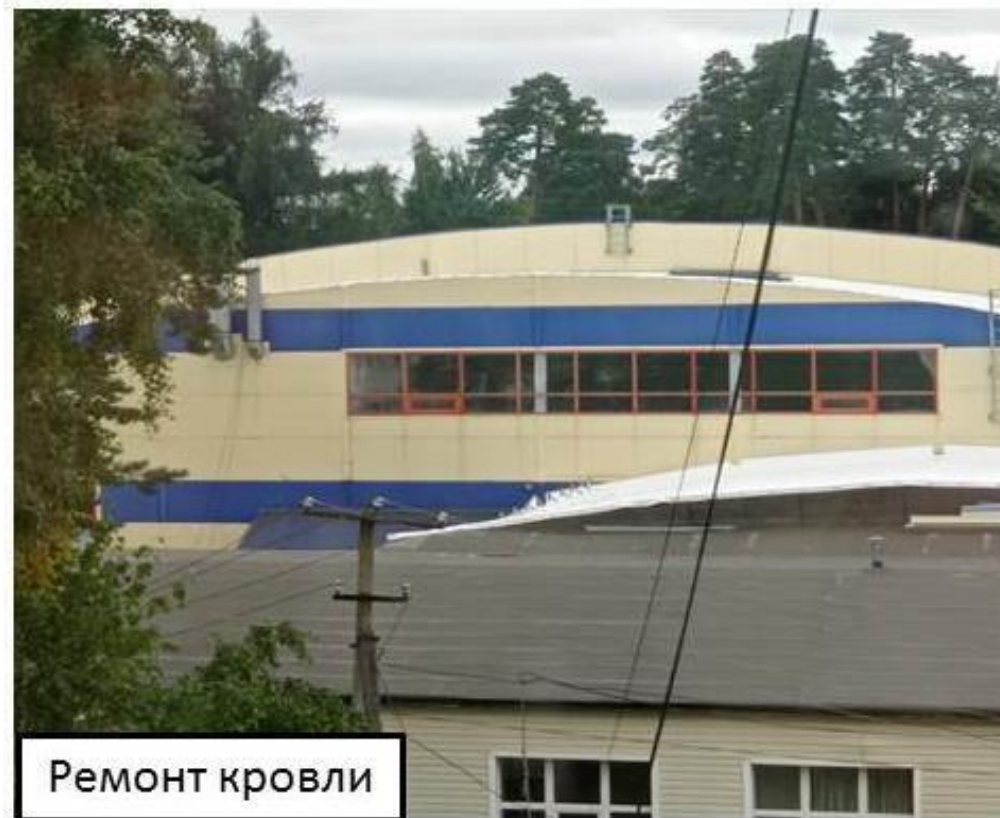

Ремонт кровли

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
Наименование муниципального образования Дмитровский городской округ

Наименование проекта проект инициативного бюджетирования «Ремонтные работы для Муниципального общеобразовательного учреждения Деденевская средняя общеобразовательная школа им. Н.К. Крупской ,адрес: 141850, Российская Федерация, Московская область, Дмитровский городской округ, поселок Деденево, ул. Советская д.2»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
4 890 000,00	4 000 000,00	597 000,00	293 000,00	4 889 999,92	3 999 999,93	596 999,99	293 000,00	4 889 999,92	3 999 999,93	596 999,99	293 000,00	0	-	-

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 02.07.2021 г.:

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 30.07.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Кононенко Д.Х.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава Дмитровского городского округа:

Попочевный И.И.
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата 27 августа 2021

