

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Дмитровская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья" Дмитровского городского округа
Московской области. Ремонт внутренних помещений**




До




До



После

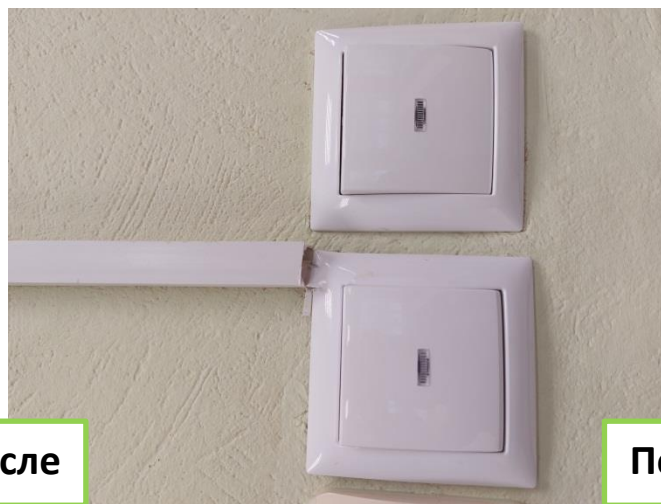

После

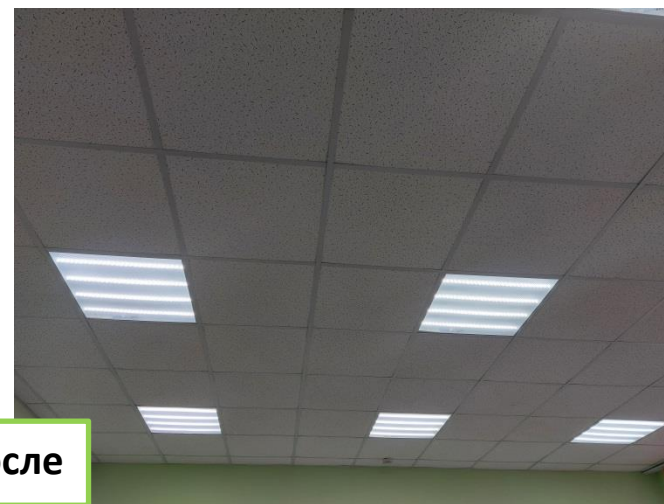

Приложение 1
к распоряжению Главного управления
территориальной политики
Московской области
от _____ № _____

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Главного управления
территориальной политики
Московской области
от _____ № _____)

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
Наименование муниципального образования Дмитровский городской округ

Наименование проекта проект инициативного бюджетирования Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Дмитровская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Дмитровского городского округа Московской области. Ремонт внутренних помещений

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток к неиспользованным средствам, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12			
385 670,00	279 960,00	82 570,00	23 140,00	385 670,00	279 960,00	82 570,00	23 140,00	385 670,00	279 960,00	82 570,00	23 140,00			

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 16.12.2022 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 21.12.2022 г.
5. К отчету прилагаются на 1 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Жигарев К.С.
(Ф.И.О.)


(подпись)

И.о.Главы Администрации Дмитровского городского округа:

Сидоров А.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)



М.П. _____
Дата: 16.12.2022
