

**«Благоустройство общественной территории по адресу:
Московская область, Дмитровский городской округ, п. Икша, ул. Заовражная (Родник)»**






После



После



После

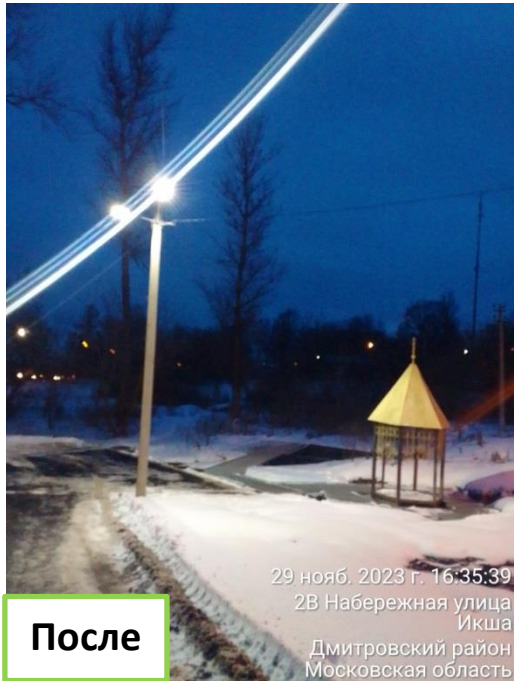

После

Приложение 1
к распоряжению Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 16.10.2023 № 13

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 16.10.2023 № 13)

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
Наименование муниципального образования Дмитровский городской округ

Наименование проекта «Благоустройство общественной территории по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, п. Икша, ул. Заовражная (Родник)»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного				Фактическое поступление средств на реализацию проекта				Использовано средств на реализацию проекта инициативного				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7+ 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	
2 397 110,00	1 788 720,00	584 420,00	23 970,00	2 397 110,00	1 788 720,00	584 420,00	23 970,00	2 065 853,81	1 541 537,11	503 658,16	20 658,54	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности


2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 26.09.2023 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 27.11.2023 г.
5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Орлов А.В.
(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава Дмитровского городского округа:

Поночевный И.И.
(Ф.И.О.)



(подпись)

Дата «04» февраля 2023 г.



