


Муниципальное общеобразовательное учреждение "гимназия "Дмитров"" - Ремонт внутренних помещений. Адрес: Московская область, г. Дмитров, ул. Инженерная, д. 24



ДО

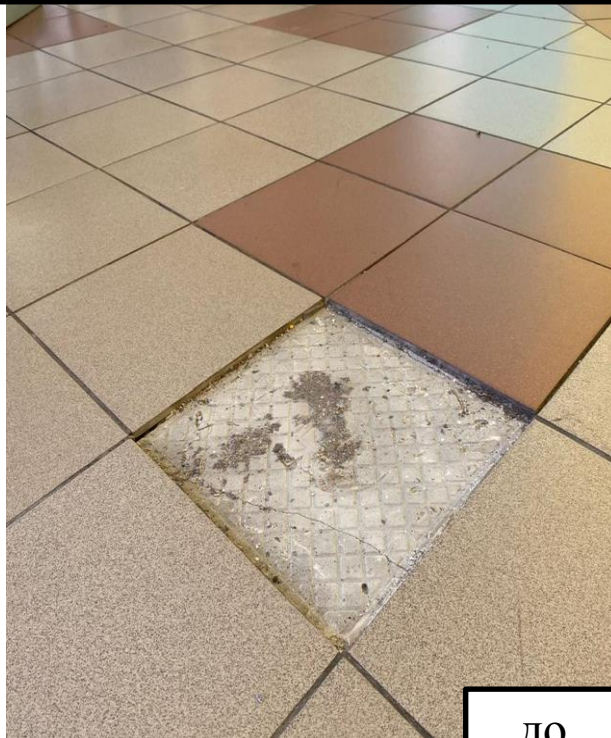

ДО



ДО



после



после



после

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
Наименование муниципального образования Дмитровский городской округ

Наименование проекта проект инициативного бюджетирования «Муниципальное общеобразовательное учреждение "гимназия "Дмитров"" - Ремонт внутренних помещений. Адрес: Московская область, г. Дмитров, ул. Инженерная, д. 24»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения	
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3				
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9			
3 668 000,00	3 000 000,00	448 000,00	220 000,00	3 668 000,00	3 000 000,00	448 000,00	220 000,00	3 668 000,00	3 000 000,00	448 000,00	220 000,00	0	-	-	

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 04.10.2021 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 29.11.2021 г.

5. К отчету прилагаются на ___ л.: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).


Инициатор (представитель инициативной группы):

Шевченко М.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава Дмитровского городского округа

Гончаров И.И.
(Ф.И.О.)


(подпись)

М.П.

Дата «02» 12 2021 г.

