

«Современные прогулочные участки – залог счастливого детства»



До



До







После



После

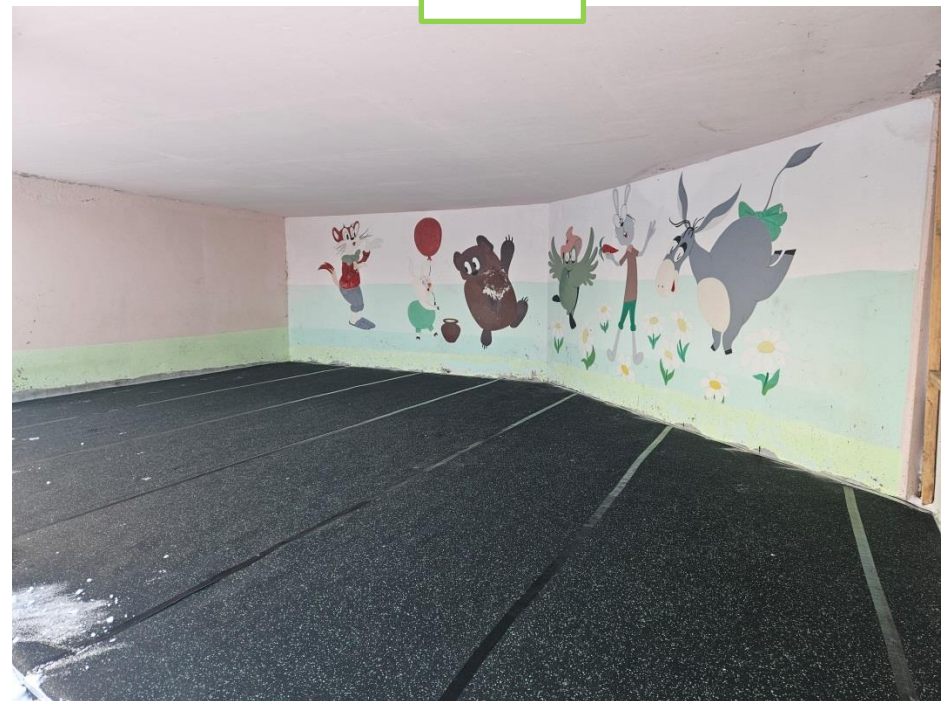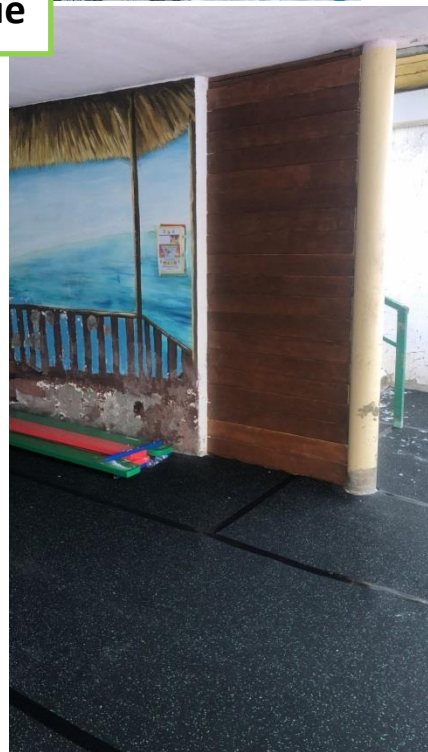

Приложение 1
к распоряжению Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 16.10.2023 № 13

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 16.10.2023 № 13)

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
Наименование муниципального образования Дмитровский городской округ

Наименование проекта «Современные прогулочные участки – залог счастливого детства»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного				Фактическое поступление средств на реализацию проекта				Использовано средств на реализацию проекта инициативного				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	
2 695 420,00	2 500 000,00	168 460,00	26 960,00	2 695 420,00	2 500 000,00	168 460,00	26 960,00	2 695 420,00	2 500 000,00	168 460,00	26 960,00	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/не реализован)


2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 15.10.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 11.12.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):



Шевченко М.В.
(Ф.И.О.)

Шевченко

(подпись)

Глава Дмитровского городского округа:

Пончевный И.И.
(Ф.И.О.)

Пончевный

(подпись)

М.П.

Дата «14» декабря 2023 г.
