



# «Прачечная современного дошкольного учреждения – гарант чистоты»




До

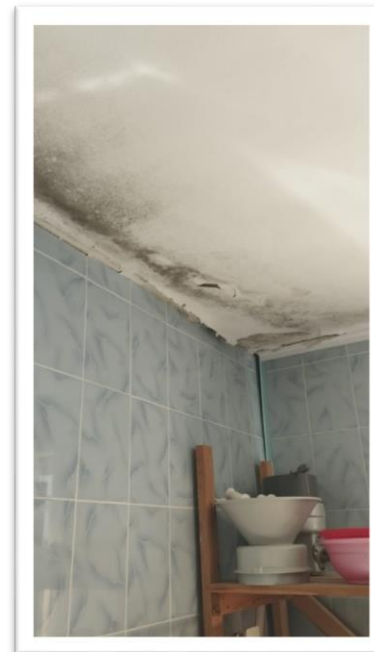

До

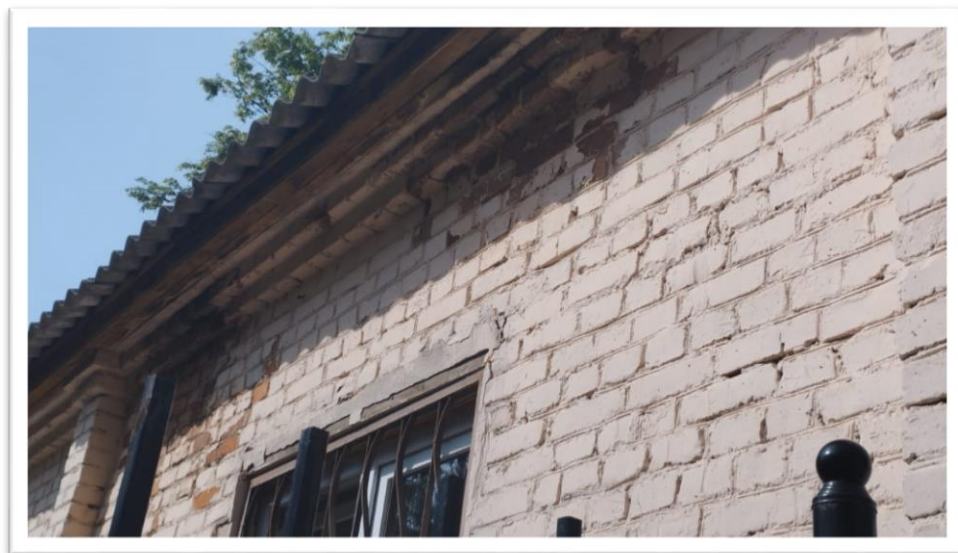

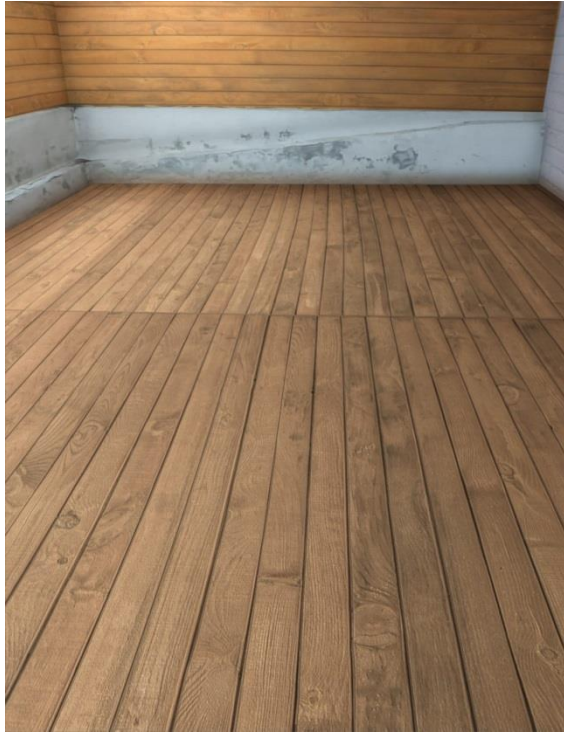

После



После



Приложение 1  
к распоряжению Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.10.2023 № 13

«УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.10.2023 № 13)

Форма

### ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования  
Наименование муниципального образования Дмитровский городской округ

Наименование проекта «Прачечная современного дошкольного учреждения – гарант чистоты»

#### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного				Фактическое поступление средств на реализацию проекта				Использовано средств на реализацию проекта инициативного				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	
2 215 910,00	1 999 860,00	193 890,00	22 160,00	2 215 910,00	1 999 860,00	193 890,00	22 160,00	2 215 909,79	1 999 859,81	193 890,00	22 159,98	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

#### 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:


3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 15.10.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 21.12.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).


Инициатор (представитель инициативной группы):

Шевченко М.В.  
(Ф.И.О.)

 (подпись)

Глава Дмитровского городского округа:

Поночевный И.И.  
(Ф.И.О.)

 (подпись)

М.П.

Дата «22» декабря 2023г.

